

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 2/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

SUMÁRIO

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PÁGINA</u>
1.0	INTRODUÇÃO	3
2.0	OBJETIVO	4
3.0	DESCRIÇÃO DA BARRAGEM	5
4.0	DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS	7
5.0	CÓDIGOS E NORMAS	8
6.0	CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESCARACTERIZAÇÃO	9
7.0	RESPONSABILIDADES TÉCNICAS	18
8.0	ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	18
9.0	EQUIPE TÉCNICA	46
10.0	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	47
11.0	ASSINATURAS	48
12.0	ANEXOS	49

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 3/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

1.0 INTRODUÇÃO

A DF+ Engenharia desenvolveu para a MOSAIC Fertilizantes, ao final de 2019, o projeto detalhado de descaracterização da Barragem B5, que possui seu último alteamento executado pelo método de montante. O projeto teve o intuito de atender a legislação vigente da época (Resolução Nº13/2019 da ANM), que estabelecia que barragens com alteamentos a montante devem ser descaracterizadas.

A partir das análises de estabilidade desenvolvidas no projeto de descaracterização da estrutura, observou-se fatores de segurança menores que os mínimos estabelecidos pelo “*Termo de Referência de Descaracterização de Barragens Alteadas pelo Método de Montante – TR*”, elaborado pela FEAM, que define:

“Independentemente da condição de estabilidade definida na etapa de diagnóstico, todos os projetos deverão considerar um fator de segurança maior ou igual a 1.3, para condições não drenadas de pico e 1,1 para a condição não drenada residual para o início das obras de descaracterização. Ressalta-se que as estruturas que não possuam os referidos fatores de segurança deverão aplicar medidas de estabilização e/ou reforço para atingir no mínimo os fatores de segurança mencionados, como condição pretérita para iniciar as atividades de descaracterização.”

Portanto, o projeto de descaracterização, em linhas gerais, previu um reforço de pé para atender aos fatores de segurança mínimos preconizados no TR supracitado, além do deslocamento do eixo da barragem para linha de centro com a implantação de um aterro de adequação e a escavação parcial do alteamento à montante e da praia de rejeitos *underflow* até a El. 964,50 m. Posteriormente, será realizada a regularização de toda a área do reservatório com o direcionamento da drenagem superficial para o Canal do Reservatório, que por sua vez irá desembocar no Canal Periférico, localizado na margem esquerda.

O referido projeto foi protocolado pela Mosaic em 10/07/2020 junto a FEAM/Núcleo de Gestão de Barragens, protocolo JU 96947578 2 BR. O cronograma constante do projeto estava de acordo com o previsto na Resolução nº 13 da ANM, norma legal vigente à época. As obras foram iniciadas em 22/06/2020.

No entanto, em setembro de 2020, foi promulgada a Lei 14.066, que alterou a Lei 12.334 de 2010 entre outras. O Art. 3º da primeira acrescentou alguns artigos à Lei 12.334, dentre eles o Art. 2º-A, que alterou o prazo para conclusão da descaracterização de barragens à montante para 25 de fevereiro de 2022:

§ 2º O empreendedor deve concluir a descaracterização da barragem construída ou alteada pelo método a montante até 25 de fevereiro de 2022, considerada a solução técnica exigida pela entidade que regula e fiscaliza a atividade minerária e pela autoridade licenciadora do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). (Incluído pela Lei nº 14.066, de 2020)

O cronograma do projeto foi reavaliado à luz da nova legislação, especialmente quanto ao prazo para conclusão das obras e verificou-se uma série de inviabilidades técnicas que não

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 4/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

permitem que o cronograma seja ajustado para o cumprimento de tal prazo, o que traria inclusive prejuízo às atividades essenciais que garantem a estabilidade e segurança da estrutura durante o processo de descaracterização.

Neste sentido, foi elaborado pela DF+ o relatório técnico de número DF21-047E-1-EG-RTE-0011 indicando as justificativas técnicas que demonstram a necessidade de prorrogação do prazo para conclusão das obras, nos termos do inciso terceiro do mesmo artigo mencionado, conforme transcrito abaixo:

§ 3º A entidade que regula e fiscaliza a atividade minerária pode prorrogar o prazo previsto no § 2º deste artigo em razão da inviabilidade técnica para a execução da descaracterização da barragem no período previsto, desde que a decisão, para cada estrutura, seja referendada pela autoridade licenciadora do Sisnama. (Incluído pela Lei nº 14.066, de 2020)

A partir desse documento, foi estabelecido em 25 de fevereiro de 2022 um **Termo de Compromisso** entre a Mosaic Fertilizantes e os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização do cumprimento das legislações vigentes: Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF), Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e Agência Nacional de Mineração (ANM). O Termo de compromisso determina, entre outros, que a Mosaic Fertilizantes deverá emitir e apresentar Relatórios Trimestrais de Obra, conforme transcrito abaixo:

3.1. Sem prejuízo do atendimento de quaisquer solicitações de informação que se fizerem necessárias no curso da vigência deste Termo de Compromisso, a MOSAIC se obriga a emitir e apresentar, à ANM e à FEAM, relatórios trimestrais acerca do andamento das obras de descaracterização, que deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: atividades realizadas no mês; percentual de avanço no processo de descaracterização; cumprimento das ações previstas na respectiva etapa do cronograma até a completa descaracterização. Os relatórios deverão conter, ainda, os dados técnicos a serem estabelecidos em Termo de Referência a ser expedido pelos órgãos competentes.

Neste sentido, a Mosaic solicitou à DF+ a elaboração de relatórios técnicos trimestrais apresentando as informações acerca do andamento das obras de descaracterização da Barragem B5, incluindo a situação atual das obras e as etapas já executadas.

2.0 OBJETIVO

Este décimo quarto relatório trimestral tem a finalidade de apresentar a situação atual das atividades realizadas nas obras de descaracterização da Barragem B5 no período entre junho de 2025 e agosto de 2025, informando o percentual de avanço no processo de descaracterização e o cumprimento das ações previstas na respectiva etapa do cronograma até a completa descaracterização, garantindo o cumprimento ao que foi estabelecido no Termo de Compromisso firmado entre a Mosaic Fertilizantes e aos órgãos públicos competentes.

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 5/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

3.0 DESCRIÇÃO DA BARRAGEM

Este capítulo destina-se a apresentar as principais características e informações relacionadas à Barragem B5.

3.1 LOCALIZAÇÃO E ACESSO

O Complexo Minerquímico de Araxá está localizado no Município de Araxá, oeste do Estado de Minas Gerais. O acesso pode ser realizado, a partir da cidade de Belo Horizonte, pela BR 262 em direção ao Triângulo Mineiro até o trevo de Araxá, percorrendo-se uma distância aproximada de 382 quilômetros. A partir do centro da cidade de Araxá, o acesso ao Complexo Minerquímico é efetuado pela Avenida Arafertil, sentido Centro-Barreiro, um trajeto com aproximadamente 5 quilômetros de distância. Na Figura 3.1 é apresentada a localização da Barragem B5 (Araxá), integrante do Complexo Minerquímico de Araxá.

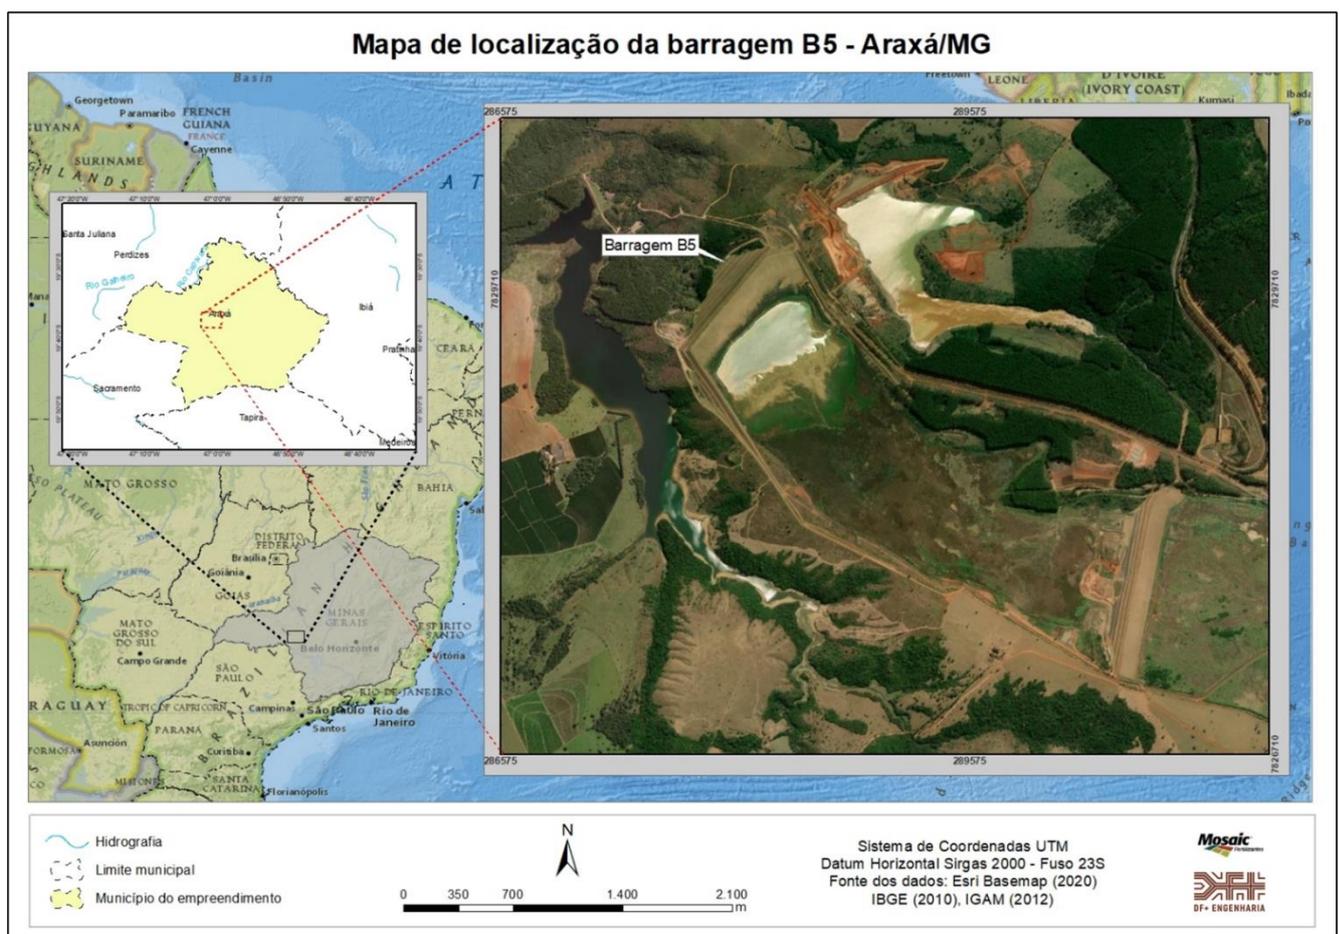


Figura 3.1 – Localização da Barragem B5.

3.2 FICHA TÉCNICA

A Barragem B5 foi projetada com seção transversal mista, apresentando atualmente crista na El. 968 m e maciço com 73 m na seção de maior altura. Sua finalidade é de contenção de

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 6/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

rejeitos finos (overflow) produzidos na usina da planta. O maciço principal foi integralmente construído em rejeito granular (underflow), com exceção do seu dique inicial, executado em solo argiloso. A estrutura apresenta ainda diques de sela em ambas as ombreiras, construídos em solo argiloso e com a presença de sistema de drenagem interna.

Atualmente a Barragem B5 encontra-se desativada, ou seja, a estrutura não está mais recebendo aporte de rejeitos. A Tabela 3.1 resume as principais características da barragem, conforme apresentado no último relatório da revisão periódica de segurança de barragem, o RPSB, elaborado pela Walm (WBH122-17-MOSC149-RTE-0001) em 2020 e com as devidas atualizações apresentadas no RISR de agosto de 2021.

Tabela 3.1 – Ficha Técnica da Barragem B5.

CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO E DA CONSTRUÇÃO	
Dados Gerais	
Finalidade ¹	Contenção de rejeitos
Empresas Projetistas ²	Maciço Inicial: 1986 (Paulo Abib Engenharia SA.) Alteamento 2ª Etapa El. 960 m: 2011 (Geoconsultoria) Alteamento 3ª Etapa El. 964 m: 2013 (Geoconsultoria) Alteamento 4ª Etapa El. 970 m: 2013 (Geoconsultoria)
Método Construtivo	Linha de Centro / Montante
Construção – Etapas ²	Maciço Inicial / Alteamentos Contínuos
Elevação do Coroamento ²	El. 968,00 m
Extensão atual do coroamento ²	3.270 m
Altura atual ²	72 m
Volume útil (Volume acumulado até a soleira do vertedouro) ²	53.600.447,34 m ³
Tipo de Seção ¹	Estrutura Principal – Mista Dique de Sela - Homogênea
Drenagem Interna ¹	Dique Inicial – Filtro vertical conectado a um tapete drenante. Último alteamento – drenos sobre berma e no contorno periférico e por drenos de pé nas extremidades do aterro com rejeitos sobre o terreno natural. Dique de Sela – Filtro vertical conectado a um tapete drenante
Drenagem Superficial ¹	Barragem - Não possui dispositivos implantados. Dique de Sela - canaleta em degraus, em concreto, ao longo do pé de jusante do dique, na sua lateral esquerda. Sobre a berma da cota 950 m será instalada também uma canaleta de concreto, que deverá desaguar na canaleta periférica esquerda. No lado direito jusante, ao longo da curva de nível de cota 950 m, foi prevista uma valeta, escavada no terreno natural, sem revestimento, cuja finalidade é interceptar as águas de chuva, evitando que elas possam causar erosão no pé do talude e assorear a saída do sistema de drenagem interna.
Instrumentação ¹	14 piezômetros, 27 indicadores de nível d'água, 5 medidores de vazão, 18 marcos superficiais, 1 régua graduada instalada no próprio reservatório, 1 pluviômetro e 8 tiltímetros.

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 7/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

CARACTERIZAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO E DA CONSTRUÇÃO	
Dados Gerais	
Hidrologia / Hidráulica	
Área da Bacia ¹	7,0 km ²
Tempo de Concentração	1,56 h
Precipitação de Projeto ²	794,50 mm
Cheia de Projeto ¹	TR 10.000 anos
Vazão Máxima Afluente ²	9,38 m ³ /s
Vazão de Projeto ²	2,8 m ³ /s
NA Normal Operacional ²	961,93 m
NA Máximo Maximorum ²	964,27 m
Borda Livre (NA _{max} , Maximorum) ¹	1,73 m (elevação da crista 968m)

1: RISR de agosto de 2021, elaborado pela WALM em 2021.

2: RPSB de julho de 2020, elaborado pela Walm em 2020.

4.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIAS

Para a elaboração do presente estudo, os documentos foram obtidos através de consulta ao sistema SGPSB da MOSAIC, disponibilizados via e-mail ou foram documentos desenvolvidos pela DF+.

Os principais documentos utilizados na elaboração e que serão constantemente citados no decorrer deste estudo são apresentados na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 – Documentos de referência.

Documento	Título / Descrição	Empresa	Ano
CG_Descaracterização B5.pdf	Cronograma do Projeto de Descaracterização da Barragem B5 – CMA – Agosto 2024	Mosaic	2025
Fotos das obras	Fotos da situação atual das obras. Fotos feitas pelo ATO da DF+.	DF+	2025
TAC MOSAIC (FEAM).pdf	Termo de Compromisso firmado entre Mosaic Fertilizantes e órgãos públicos competentes.	Mosaic	2022
Memorial Descritivo Rev 5_Rev.docx	Memorial Descritivo dos Serviços.	Mosaic	2022
DF22-C074-5-GTC-DWG-001	Projeto Detalhado – Barragens – Descaracterização da Barragem B5 – Dreno da Ombreira Direita – Planta, Perfil e Seção Típica.	DF+	2022

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 8/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

Documento	Título / Descrição	Empresa	Ano
DF19-214-1-EG-RTE-0008	Projeto Detalhado – Barragens – Descaracterização da Barragem B5 – Resposta ao Ofício FEAM/NUBAR N°368/2021 - Relatório Técnico	DF+	2021
DF19-214-1-EG-RTE-0012	Projeto Detalhado – Barragens – Descaracterização da Barragem B5 – Adequação para linha de centro - Relatório Técnico	DF+	2021
WA008210051-GT-RTE-0012	Auditoria Técnica de Segurança 2º Ciclo de 2021 – Complexo CMA – Barragem B5, elaborado pela Walm em agosto de 2021.	Walm	2021
WBH122-17-MOSC149-RTE-0001	Estudo Técnico – Complexo de Mineração de Araxá – CMA – Revisão Periódica de Segurança de Barragem – RPSB – Barragem B5 – Relatório Técnico.	Walm	2020
DF19-214-1-EG-PLA-0008	Projeto Detalhado – Barragens – Descaracterização da Barragem B5 – Planilha de Quantidades	DF+	2020
DF19-214-1-EG-RTE-0009	Projeto Detalhado – Barragens – Descaracterização da Barragem B5 – Relatório Técnico.	DF+	2019
DF19-214-1-EG-RTE-0010	Projeto Detalhado – Barragens – Descaracterização da Barragem B5 – Rebaixamento do N.A do reservatório durante o período de obras - Relatório Técnico	DF+	2019
DF19-214-1-EG-DWG-0017	Projeto Detalhado – Barragens – Descaracterização da Barragem B5 – ARRANJO Geral - Planta	DF+	2019

5.0 CÓDIGOS E NORMAS

Este documento considera a última edição dos códigos e normas citados a seguir, além das leis e regulamentações das autoridades locais. Em caso de conflito, o mais estrito prevalece.

Lei Federal 12.334 / 2010

Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens - PNSB e a criação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens - SNISB.

ABNT NBR 13.028:2017

Mineração – Elaboração e apresentação de projeto de barragens para disposição de rejeitos, contenção de sedimento e reservação de água – Requisitos.

Resolução da ANM Nº 95/2022

Consolida os atos normativos que dispõem sobre segurança de barragens de mineração.

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 9/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

Resolução da ANM Nº 130/2023	Altera a Resolução ANM nº 95, de 7 de fevereiro de 2022, e dá outras providências.
Lei Federal nº 14.066 / 2020	Altera a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), a Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, e o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração).
Resolução conjunta Nº2.784/ 2019 - SEMAD/FEAM	Determina a descaracterização de todas as barragens de contenção de rejeitos e resíduos, alteadas pelo método a montante, provenientes de atividades minerárias, existentes em Minas Gerais e dá outras providências.
Termo de referência para descaracterização de barragens alteadas pelo método de montante	Estabelece os requisitos mínimos de um Projeto para a Descaracterização de Barragens alteadas pelo método montante no Estado de Minas Gerais a ser apresentado à Fundação Estadual de Meio Ambiente, conforme previsto na Lei 23.291, de fevereiro de 2019, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragem.

6.0 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESCARACTERIZAÇÃO

Este capítulo apresenta o conceito e a sequência construtiva do Projeto de Descaracterização da Barragem B5 - Complexo Mineralógico de Araxá, assim como seu faseamento construtivo de acordo com cronograma disponibilizado pela Mosaic.

6.1 CONCEPÇÃO DO PROJETO

O Projeto de Descaracterização da Barragem B5, elaborado pela DF+ (relatório técnico DF19-214-1-EG-RTE-0009), buscou atender a definição de descaracterização apresentada na Resolução Nº 13 da ANM e ao “*Termo de Referência de Descaracterização de Barragens Alteadas pelo Método de Montante – TR*”, elaborado pela FEAM. Assim sendo, abaixo estão listadas as intervenções concebidas no projeto que se enquadram aos quatro itens base da descaracterização previstos na referida resolução.

I - Descomissionamento

- Estrutura não se encontra em operação.

II - Controle hidrológico e hidrogeológico

- Desaguamento de todo o lago existente e eliminação do efeito de amortecimento de cheias;
- Regularização de todo o reservatório, garantindo declividade no sentido de montante para jusante, direcionando o escoamento para as estruturas propostas;

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 10/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

- Adequação da drenagem superficial de todo o reservatório com a execução de um selo argiloso;
- Canais de drenagem e sistema extravasor capazes de transitar cheias de recorrência associada de 10.000 anos;
- Bacia de dissipação a jusante do Sistema Extravasor com a função de direcionar a vazão afluyente advindas das Barragens B5 e B1/B4 para o Córrego Ribeirinhas, a jusante.

III - Estabilização

- Reforço do maciço da barragem;
- Readequação do eixo do maciço para linha de centro;
- Impermeabilização do reservatório.

IV - Monitoramento

- Plano de instrumentação complementar.

A Figura 6.1 apresenta o arranjo geral da concepção proposta e as seções analisadas em projeto.

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO	Nº MOSAIC -	PÁGINA 11/50	
	Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0	

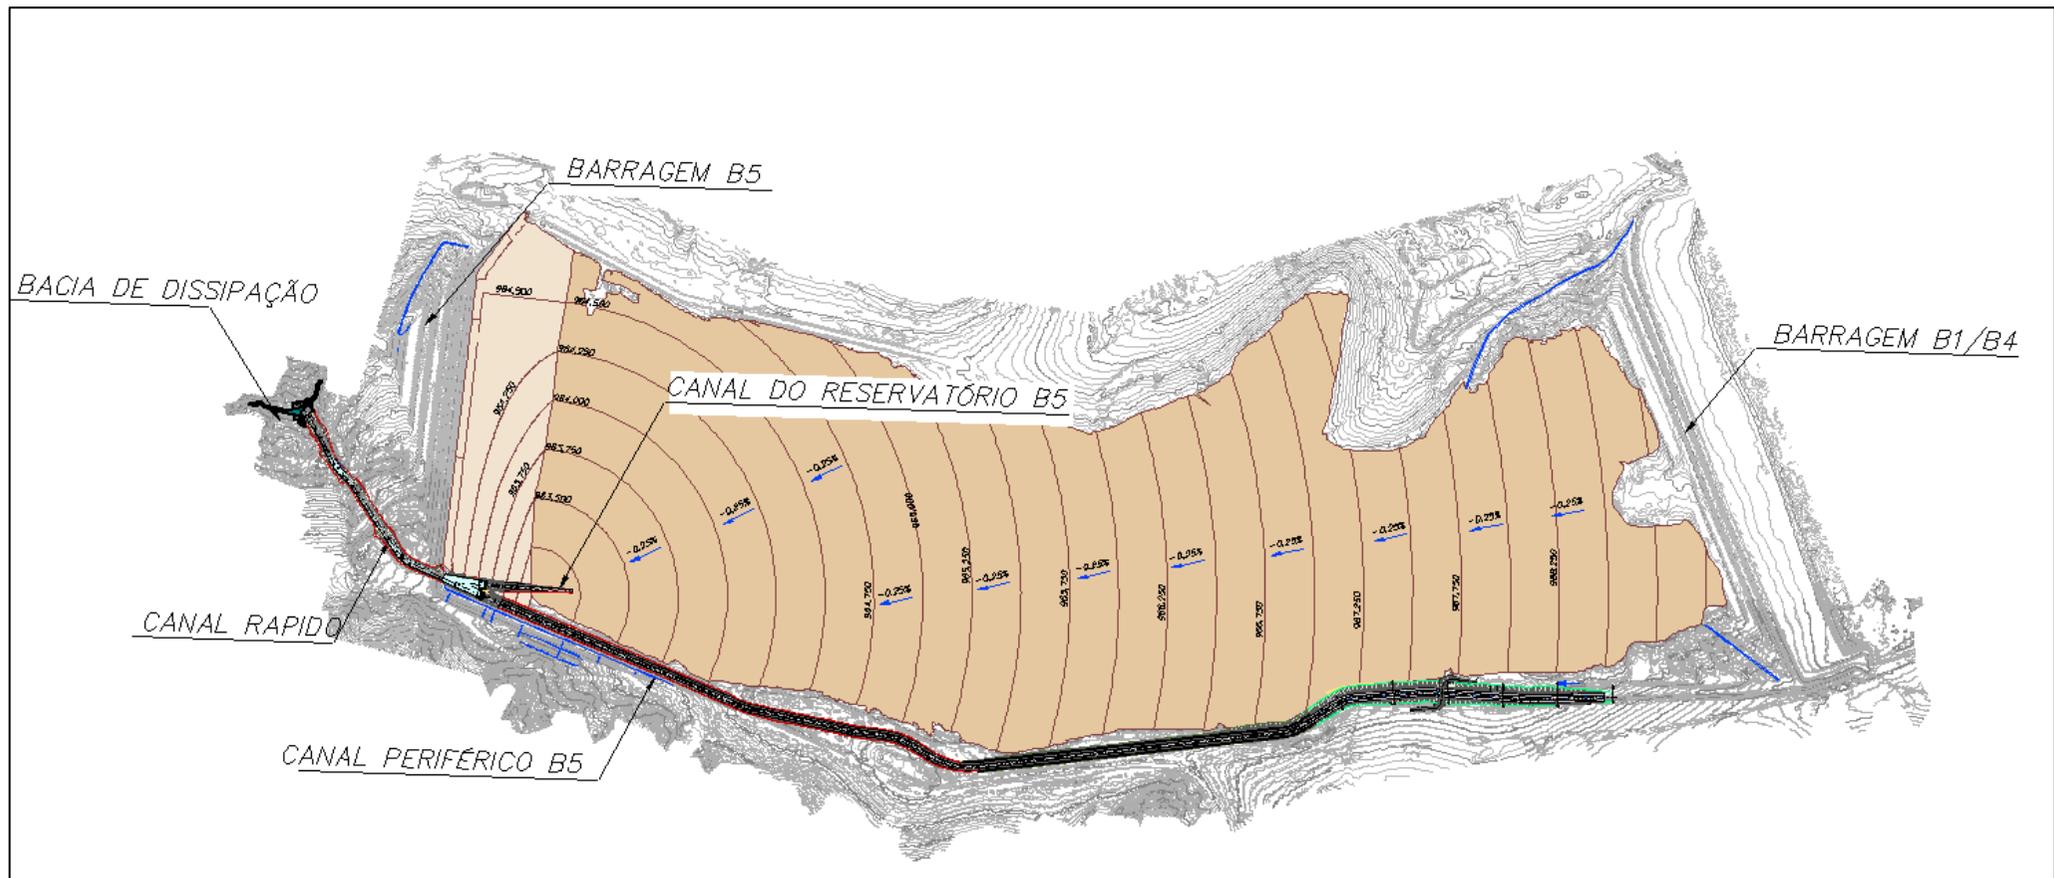


Figura 6.1 – Arranjo Geral do projeto de descaracterização da Barragem B5.

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 12/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

6.2 SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA

A sequência construtiva da obra proposta no relatório do projeto de descaracterização da Barragem B5 (DF19-214-1-EG-RTE-0009) foi dividida em 10 etapas, sendo apresentadas a seguir:

- Etapa 1 – Atividades Preliminares
 - Montagem do Canteiro de Obras;
 - Regularização do pátio de bota-espera de rejeito de magnetita e materiais pétreos dos canais em enrocamento;
 - Implantação do sistema de bombeamento;
 - Desaguamento do lago existente com despesca conforme autorização SEMAD.
- Etapa 2 – Desvio do Sistema Extravador
 - Supressão, Destoca e Limpeza Superficial;
 - Implantação do Canal em Pedra Argamassada;
 - Demolição do Trecho do Sistema Extravador na região do reforço.
- Etapa 3 - Reforço
 - Supressão, Destoca e Limpeza Superficial;
 - Canal de Desvio para Drenar a praça para implantação do reforço;
 - Tratamento de Fundação;
 - Lançamento e Espalhamento das Transições;
 - Prolongamento do Dreno de Pé;
 - Execução do Medidor de vazão na saída do dreno de pé;
 - Lançamento e Compactação da Berma de Reforço em Rejeito de Magnetita até a El. 910,00m;
 - Execução dos Instrumentos do reforço;
 - Lançamento de *Top-soil* sobre a berma do Reforço
 - Demolição do Trecho do Sistema Extravador na região do reforço.
- Etapa 4 – Adequação para Linha de Centro
 - Implantação do trecho em aterro do septo;
 - Execução do maciço e da praia até a El. 964,50m, com o espalhamento deste material para dentro do reservatório da B5 e com a garantia da manutenção do septo de segurança hidráulica no canal do reservatório da B5, nesta mesma elevação;
 - Execução da readequação do Eixo do Maciço da Barragem para Jusante, tornando a estrutura como alteada por linha de centro novamente;
 - Execução de Revestimento vegetal no maciço principal.
- Etapa 5 – Novo Sistema Extravador
 - Supressão, Destoca e Tratamento de Fundação;

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 13/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

- Execução das estacas de ancoragem;
 - Bacia de Dissipação;
 - Canal Rápido;
 - Trecho em Transição Canal Rápido – Canal Periférico B5.
- Etapa 6 – Canal do Reservatório B5
 - Escavação para Implantação do Canal do Reservatório;
 - Lançamento e Espalhamento das transições ao longo do canal do reservatório;
 - Lançamento do Enrocamento no canal do reservatório.
 - Etapa 7 – Canal Periférico B5
 - Escavação para implantação do Canal Periférico;
 - Instalação da geomembrana de PEAD no trecho previsto no canal periférico;
 - Lançamento e espalhamento das transições ao longo do canal periférico;
 - Lançamento do enrocamento no canal periférico.
 - Etapa 8 – Regularização do reservatório
 - Espalhamento e regularização do material siltoso no reservatório;
 - Execução da camada de selo argiloso no reservatório;
 - Tamponamento do sistema extravasor atual.
 - Etapa 9 – Descomissionamento das estruturas provisórias
 - Remoção do Septo de Segurança e Complemento do Canal do Reservatório;
 - Remoção do Sistema de Bombeamento.
 - Etapa 10 – Revestimento Vegetal e Monitoramento
 - Execução dos 8 Indicadores de nível d'água ao longo do reservatório;
 - Execução do Revestimento vegetal ao longo de todo o reservatório.

6.3 FASEAMENTO CONSTRUTIVO

As atividades de descaracterização da Barragem B5 foram subdivididas em três fases, conforme o cronograma disponibilizado pela Mosaic. As obras de descaracterização da Barragem B5 tiveram início em 22/06/2020, com previsão de término em 30/07/2027. A primeira fase do cronograma possuía previsão de término em fevereiro de 2022. No entanto, devido a atrasos na obtenção da licença ambiental na região de jusante da Barragem B5 (como detalhado no item 6.3.1 a seguir), este prazo foi estendido para dezembro de 2022. Desta forma, o cronograma foi atualizado, sendo apresentado no **Anexo A** deste documento. As principais atividades referentes a esta fase estão apresentadas a seguir:

- Reforço;
- Readequação da estrutura para Linha de Centro;
- Remoção do Alçamento a montante até a El. 964,50 m.

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 14/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

Já a segunda fase, devido ao atraso supracitado, possuía previsão de término em novembro de 2023 e teve seu prazo de conclusão estendido para abril de 2025. As principais atividades referentes a esta fase estão apresentadas a seguir:

- Canal Periférico;
- Canal do Reservatório;
- Canal Rápido;
- Bacia de Dissipação.

Por fim, as principais atividades da terceira fase, possuíam previsão de término em julho de 2027 e tiveram seu prazo de conclusão estendido para julho de 2028 e contemplam:

- Regularização do Reservatório;
- Selo Argiloso do Reservatório;
- Tamponamento do Sistema Extravasador Atual;
- Instalação da Instrumentação de Controle;
- Revestimento Vegetal do Reservatório.

6.3.1 Fase 01

De acordo com os estudos realizados no relatório técnico do projeto de descaracterização da Barragem B5 (DF19-214-1-EG-RTE-0009), considerando o atendimento dos requisitos da Resolução Conjunta SEMAD/FEAM nº 2.784 de 21 de março 2019, instituiu o “*Termo de Referência de Descaracterização de Barragens Alteadas pelo Método de Montante – TR*”, foi prevista a execução de um reforço à jusante do maciço para que então seja feita a readequação da estrutura para linha de centro e posterior remoção do alteamento a montante até a El. 964,50 m.

O reforço proposto é constituído de rejeito de magnetita, que possui características francamente arenosas. Também foi previsto o prolongamento do dreno de pé atualmente existente, para garantir a saída livre do sistema de drenagem interna. A altura máxima do reforço é de aproximadamente 20 metros, com talude apresentando inclinações de 3H:1V. No contato entre o reforço de magnetita e o dreno de pé foram previstas duas camadas de transição, uma em brita 0 e outra em brita 4, com espessura de 25 cm cada.

O reforço da Barragem B5, projetado para ser executado em etapa única, requer como tratamento de fundação a remoção total do solo aluvionar de consistência mole a médio. Para garantir tal cenário, o tratamento de fundação proposto (Figura 6.2) consiste em realizar uma limpeza superficial com a remoção de 30 cm de solo (área laranja da Figura 6.2) e da escavação com profundidade que varia de 0,3 metros a 3 metros (área marrom da Figura 6.2).

O tratamento de fundação (escavação da área marrom da figura) foi programado para ser executado por meio de três trincheiras.

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 15/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

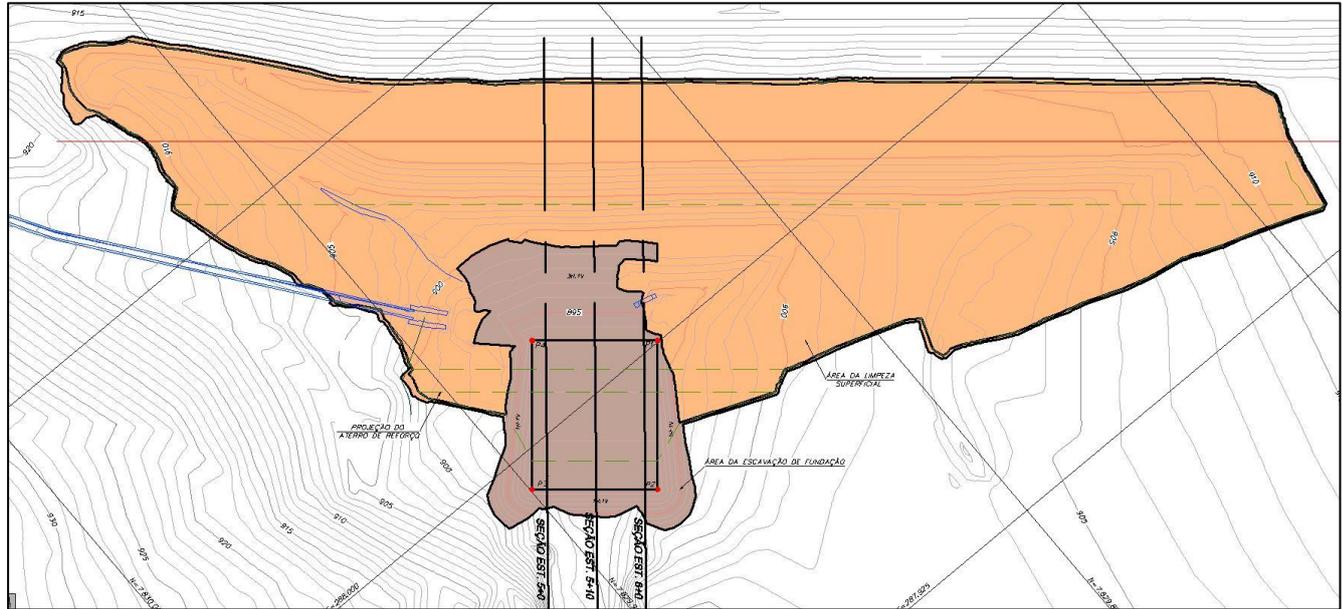


Figura 6.2 – Tratamento de Fundação para Reforço – Barragem B5

Por fim, com o intuito de tornar a Barragem B5 uma estrutura classificada como alteada por linha de centro novamente, o projeto previu a escavação do maciço até a El. 964,50 e o deslocamento do eixo para jusante com a implantação de um aterro de readequação utilizando como material o próprio rejeito underflow. Esta readequação foi prevista para ser iniciada na Berma intermediária da El 940,0 m até a El. 964,50 m com talude de 2H:1V, prevendo uma berma de 5,00 m de largura na El. 952,50 m. A Figura 6.3 apresenta o conceito proposto.

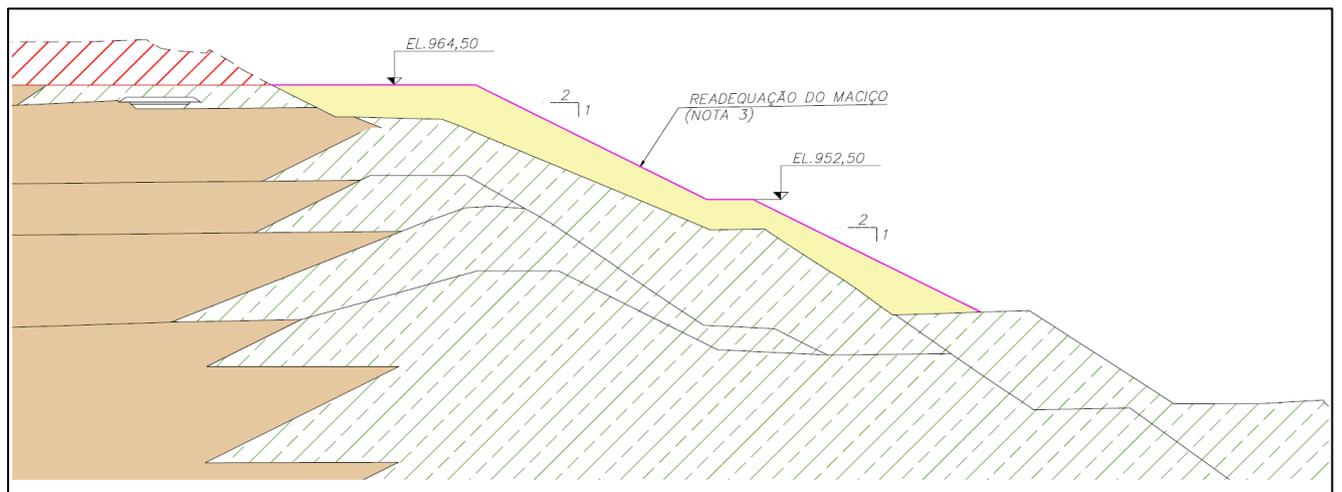


Figura 6.3 – Detalhe da Readequação para Linha de Centro (DF19-214-1-EG-DWG-0018).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 16/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

6.3.2 Fase 02

Para a execução da fase 2 do projeto de descaracterização da barragem B5, foi contratada a empresa Cimcop Engenharia e Construções, a qual teve seu início das atividades em janeiro de 2023 e a conclusão em novembro de 2024.

No intuito de evitar acúmulo de água dentro do reservatório da Barragem B5, a drenagem superficial prevista no Projeto de Descaracterização é composta por: Canal do Reservatório, Canal Periférico, Canal Rápido e Bacia de Dissipação. A Figura 6.4 apresenta o arranjo das estruturas.

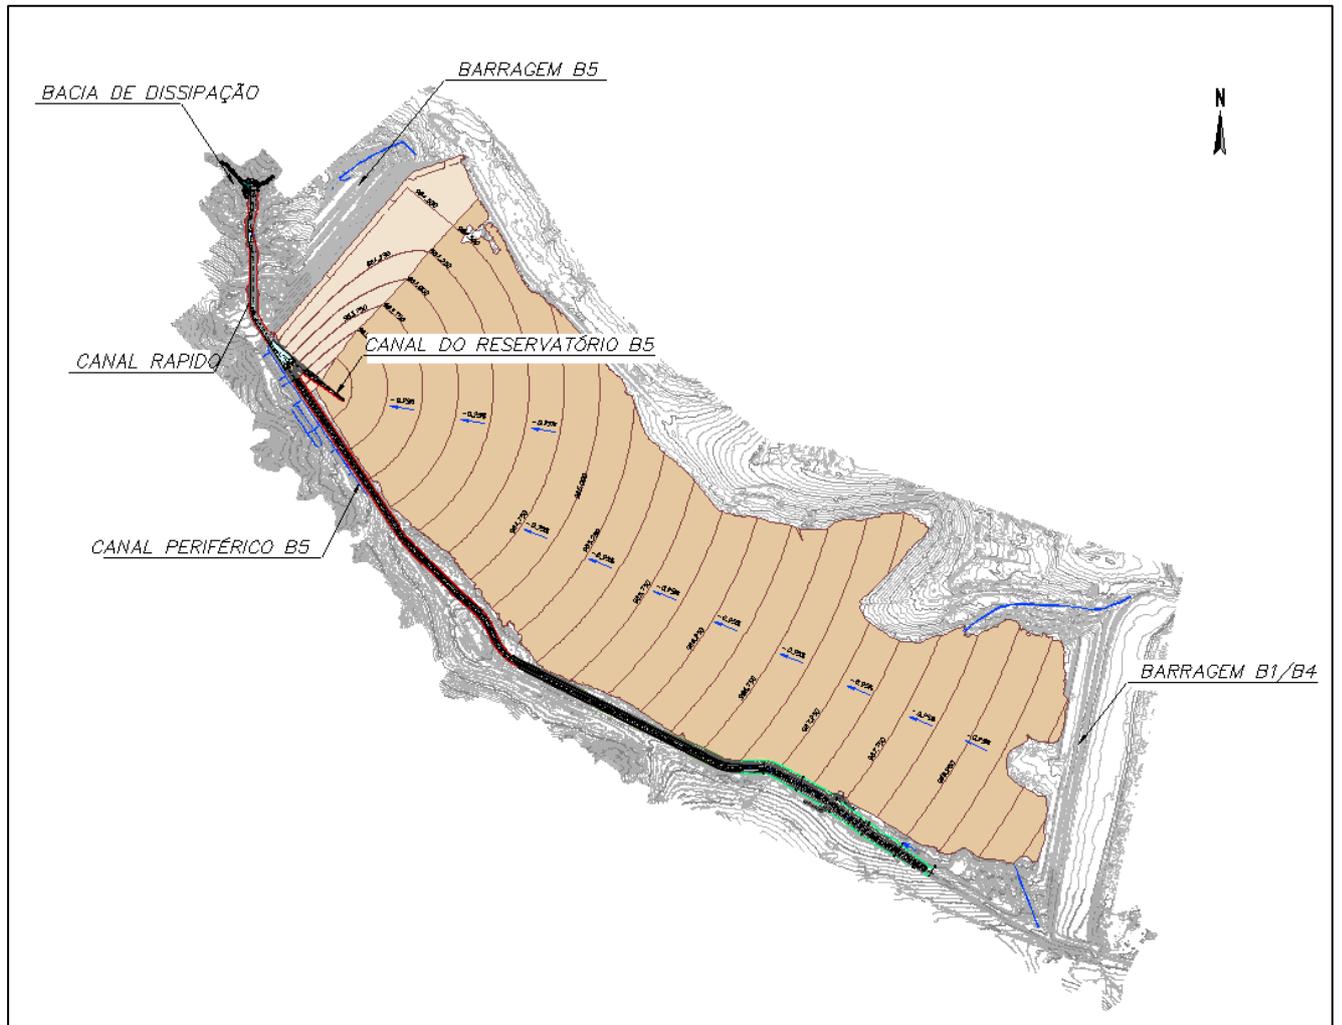


Figura 6.4 - Arranjo geral das estruturas de drenagem superficial propostas para o projeto.

De acordo com os estudos, para segunda fase foram estimados em torno de 4 km de canais no total e, por questões de segurança, não se recomenda que as escavações necessárias para estes canais sejam executadas em período de chuva. Recomenda-se que sejam executadas de jusante para montante para garantir a segurança hidráulica da estrutura e de

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 17/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

forma lenta quando dentro do reservatório da barragem, visando também a segurança da estrutura.

6.3.3 Fase 03

Conforme apresentado no relatório DF19-214-1-EG-RTE-0009, o Projeto de Descaracterização da Barragem B5 prevê, em sua fase final, a regularização, impermeabilização e proteção vegetal do reservatório. Caracterizando, por fim, a completa descaracterização da estrutura.

Em função da necessidade de regularização do reservatório, visando evitar que a estrutura tenha função de barramento, trabalhando apenas como um aterro, o uso do material siltoso foi considerado haja vista sua disponibilidade confirmada pela Mosaic. Este material será depositado em região próxima à ombreira direita da B5 e será carregado e lançado de forma mecânica (e drenada) através de caminhões basculantes. Tratores de esteira irão realizar o espalhamento do material já em condições drenadas para dentro do reservatório, considerando uma operação de ponta de aterro/agulhamento e garantindo uma declividade mínima de projeto (0,5%) na direção de montante para jusante.

No entanto, é importante ser enfatizado que a velocidade de execução das atividades de regularização do reservatório depende de diversos fatores, tais como:

- Vasta área de regularização, de aproximadamente 2,6 milhões de m²;
- Condição sub-adensada do rejeito atualmente presente no reservatório;
- Incerteza sobre a geometria interna do reservatório, uma vez que é desconhecida a sua geometria primitiva. Estima-se que em determinados pontos do reservatório a profundidade de rejeito sub-adensado pode chegar a cerca de 40 m;
- Possível variabilidade granulométrica do rejeito contido no reservatório, tanto sob o ponto de vista de sua distribuição espacial quanto temporal. Ressalta-se que o conhecimento detalhado desta variabilidade é inviável na prática, dada a extensão da área mencionada e a sua não trafegabilidade devido às condições de superfície (sub-adensada e saturada);

Dada a extensão da área onde a regularização deverá ocorrer, é pertinente admitir que o comportamento físico do rejeito em termos de adensamento e compressibilidade poderá ser bastante variável, gerando eventualmente deformações diferenciais consideráveis. Dessa forma, é altamente recomendável que as atividades de lançamento e espalhamento sejam executadas de forma lenta e qualitativa, sempre atentando-se para as condições superficiais de piso para trânsito seguro dos equipamentos de obra, podendo ser iniciada somente após a confirmação da capacidade de carga da região para o tráfego no interior do reservatório.

Portanto, a regularização do reservatório deverá ser realizada de forma gradativa e progressiva para não gerar excesso de poropressões, o que poderia ser um potencial gatilho para um processo de liquefação confinado e localizado na região da regularização, trazendo riscos aos operários e equipamentos relacionados a esta atividade da obra. Logo, o dimensionamento do número de equipamentos para a atividade, normalmente avaliada pelos

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 18/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

planejadores da obra, estará condicionado às condições do comportamento geotécnico a serem observadas em campo.

Salienta-se que a Mosaic realizou de forma operacional a execução de canais auxiliares de drenagem superficial no reservatório, através de um sistema do tipo de espinha de peixe, no intuito de auxiliar a drenagem da área como um todo e, assim, antecipar o processo de melhoria das condições superficiais para o tráfego de equipamentos quando da época de execução da fase 03.

Em seguida, será realizada a revegetação do reservatório, com o plantio de espécies rasteiras sobre a superfície.

7.0 RESPONSABILIDADES TÉCNICAS

A Tabela 7.1 apresenta a matriz de responsabilidades nas obras de descaracterização da Barragem B5.

Tabela 7.1 - Matriz de Responsabilidades nas Obras da Barragem B5.

EMPRESA	PROFISSIONAL	RESPONSABILIDADE
MOSAIC (Implantação)	Denis Alves	Proprietária e Gerenciamento da Obra
MOSAIC (Engenharia)	Thiago Silva	Engenharia / Projeto
DF+	Isabela Fonseca	Coordenação do Contrato e da Engenharia
DF+	Walmir de Castro Melo	Acompanhamento Técnico de Obra (ATO)

8.0 ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

Neste capítulo serão apresentadas as informações acerca do andamento das obras de descaracterização da Barragem B5 – Complexo Mineraloquímico de Araxá, com a situação atual das obras, atividades realizadas, o cronograma das atividades previstas no projeto de descaracterização e seus percentuais de avanço.

Na sequência das obras de descaracterização da Barragem B5, foi finalizada a Fase 2, que contemplou a execução do Canal Periférico, execução do Canal do Reservatório B5 e execução do Canal Rápido. Para execução desta fase, a Mosaic contratou a empresa Cimcop Engenharia e Construções, que iniciou as atividades de mobilização do canteiro em janeiro de 2023 e finalizou em novembro de 2024, porém, a execução do Canal do Reservatório não foi concluída por opção interna e será retomada na Fase 03. O item 8.2.2 abaixo, retrata melhor essa situação.

8.1 SITUAÇÃO ATUAL

Após a conclusão das atividades previstas na Fase 01 para as obras de descaracterização da Barragem B5, foram iniciadas as atividades da Fase 02, que contemplou a execução da

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 19/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

drenagem superficial composta por: Canal do Reservatório, Canal Periférico, Canal Rápido e Bacia de Dissipação, conforme descrito no item 6.3.2

As obras de implantação da Fase 02 para descaracterização da Barragem B5 foram concluídas em novembro de 2024 e se encontram em pleno funcionamento. Portanto no período compreendido por este relatório, não houve atividade relacionada à Fase 3, que se encontra em fase de contratação da empresa executante e não sofrerá atraso nas datas definidas no cronograma geral, conforme informado pela Mosaic. No entanto, foram realizados serviços de manutenção de taludes, acessos e nos elementos da Fase 1 e da Fase 2.

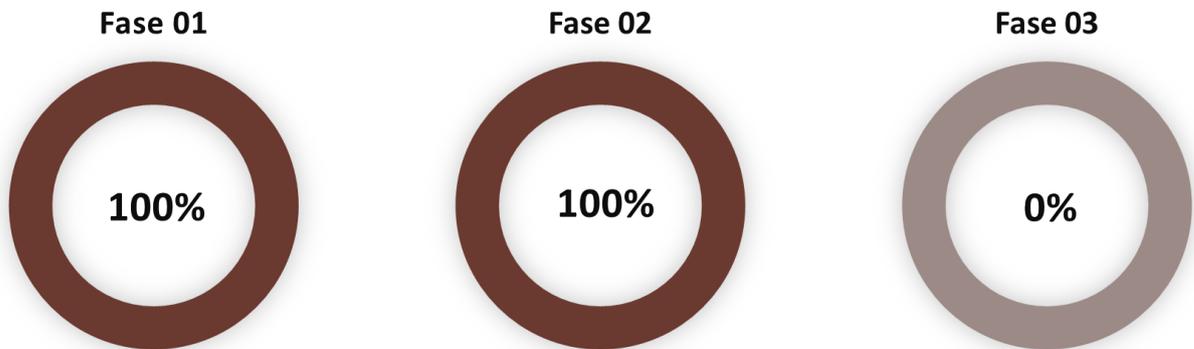


Figura 8.1 - Andamento das atividades das Fases 01, 02 e 03 das obras de descaracterização.

8.2 ATIVIDADES REALIZADAS

Nos subitens a seguir serão apresentadas as fotos para retratar as condições atuais das estruturas implementadas na Fase 01 e na Fase 02 das obras de descaracterização da Barragem B5 no período entre junho de 2025 e agosto de 2025.

8.2.1 Canal Periférico

Conforme mencionado no documento nº DF22-C074-1-ENG-RTE-009, foram finalizadas 100% das obras de implantação do canal periférico, contemplado na Fase 02 da descaracterização da Barragem B5. Este serviço está representado da Figura 8.5 à Figura 8.10.

As curvas granulométricas dos materiais aplicados nas transições, foram alteradas pela equipe de engenharia da DF+ e disponibilizadas via e-mail no dia 29/01/2024, para adequação aos materiais disponíveis na região do CMA da Mosaic. A principal alteração, está relacionada ao enrocamento utilizado na camada de proteção, onde foi alterado o D₅₀, de 330mm para 210mm, conforme apresentado pela Figura 8.2.

Conforme informado pela Mosaic, a transposição do Canal Periférico projetada pela DF+ na região da estaca 43, não foi realizada na Fase 2 e será contemplada na 3ª fase. Portanto, foi necessária a construção de uma transposição provisória, para permitir o acesso veicular às

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 20/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

equipes de monitoramento e manutenção, conforme croqui apresentado pela Mosaic e representado pela Figura 8.3 e pela Figura 8.4.

Esta travessia foi construída entre as estacas 44 e 46 e está representada pela Figura 8.5 e a Figura 8.6.

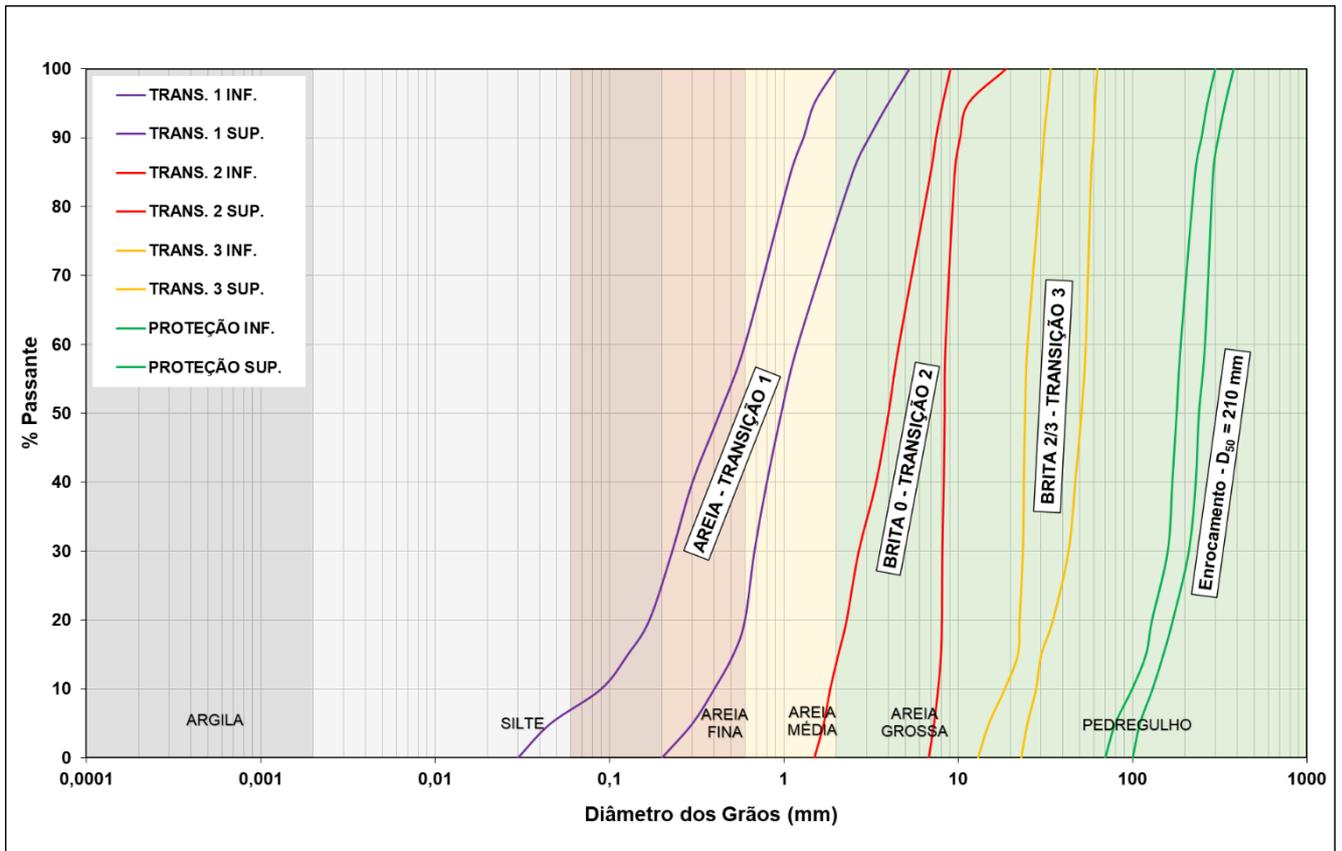


Figura 8.2 – Faixas granulométricas dos materiais granulares utilizados nas transições do canal periférico (29/01/2024).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 21/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

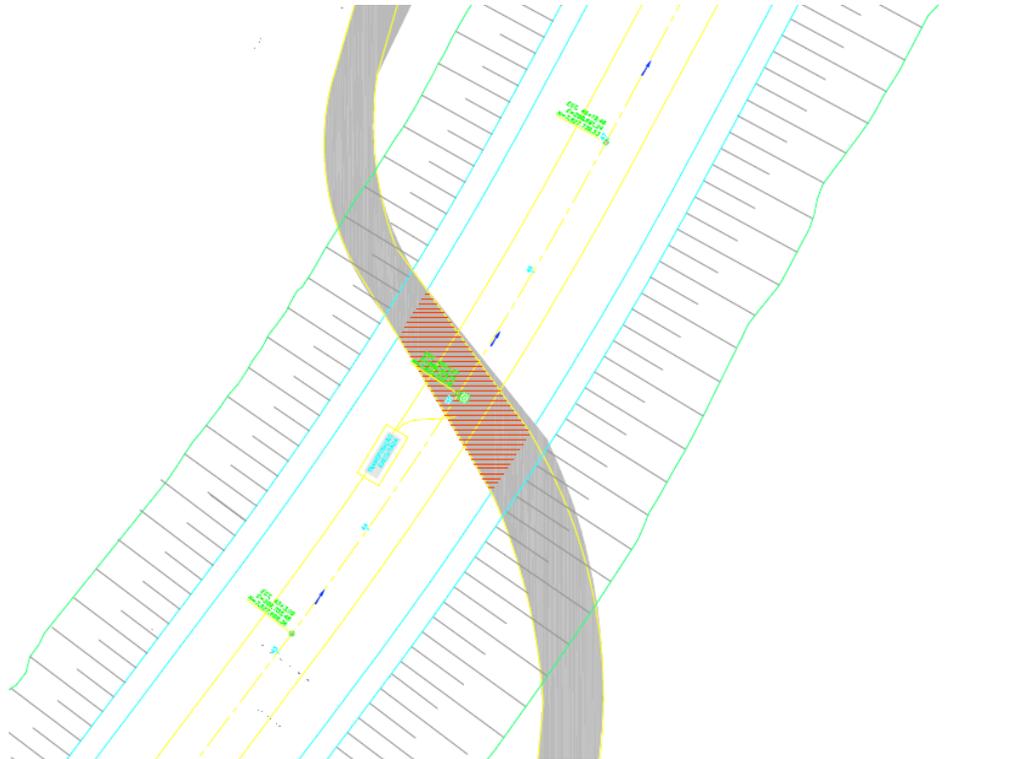


Figura 8.3 – Planta esquemática da transposição provisória, executada na região da estaca 45 (01/10/2024).

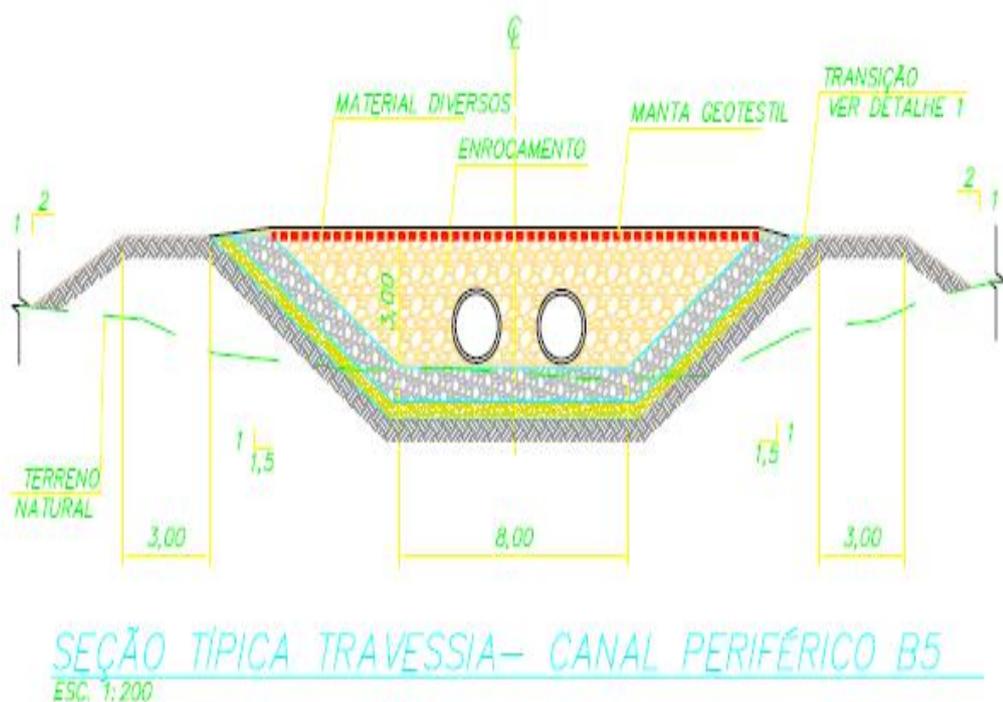


Figura 8.4 – Seção típica da transposição provisória do canal periférico (01/10/2024).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 22/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0



Figura 8.5 – Vista para montante do canal periférico na região da transposição provisória (13/08/2025).



Figura 8.6 – Vista para jusante do canal periférico, após a saída da transposição (13/08/2025).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO	Nº MOSAIC -	PÁGINA 23/50	
	Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0	



Figura 8.7 – Vista para jusante do canal periférico, na região da estaca 90 (13/08/2025).



Figura 8.8 – Vista para montante do canal extravasor, com detalhe da região do dique da ombreira esquerda (13/08/2025).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO	Nº MOSAIC -	PÁGINA 24/50	
	Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0	



Figura 8.9 – Detalhe da região de transição do canal periférico para o canal rápido, com vista para jusante (13/08/2025).



Figura 8.10 – Vista panorâmica do canal periférico (09/01/2025).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 25/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

8.2.2 Canal do Reservatório

Por solicitação da equipe de geotecnia da Mosaic, o projeto de implantação do Canal do Reservatório, sofreu alteração quanto a declividade e comprimento, de forma a permitir uma melhoria no encaixe com a implantação da fase 3.

A equipe do Projetos Correntes (Mosaic), responsável pela execução das obras de descaracterização da Barragem B5, suspendeu as escavações, e optou pela execução do Canal do Reservatório apenas na 3ª fase. Essa alteração se faz necessária devido à falta de condição de drenagem dessa água, uma vez que o N.A. está acima da linha prevista de escavação, sendo que na 3ª fase o lago da B5 será totalmente esgotado, fazendo a linha freática rebaixar. Além disso, o Canal do Reservatório só entrará em operação após o término da regularização do reservatório, prevista para a 3ª fase das obras. Portanto, a construção do Canal do Reservatório acontecerá também na 3ª fase. Este serviço está representado entre a Figura 8.11 e a Figura 8.13.



Figura 8.11 – Detalhe do canal do reservatório, com vista para montante (13/08/2025).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO	Nº MOSAIC -	PÁGINA 26/50	
	Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0	



Figura 8.12 – Detalhe da região de transição do canal do reservatório para o canal rápido, com vista para jusante (13/08/2025).



Figura 8.13 – Detalhe do canal do reservatório, na região de transição com o canal rápido (09/01/2025).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 27/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

8.2.3 Canal Rápido

Conforme mencionado no documento nº DF22-C074-1-ENG-RTE-009, foram finalizadas 100% das obras de implantação do canal rápido, referente à Fase 02 da descaracterização da Barragem B5. Este serviço está representado entre a Figura 8.14 e a Figura 8.18.



Figura 8.14 – Vista interna para jusante do canal rápido (13/08/2025)

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO	Nº MOSAIC -	PÁGINA 28/50	
	Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0	



Figura 8.15 – Área de transição do canal periférico e canal do reservatório para o canal rápido, com vista para montante (14/05/2025).



Figura 8.16 – Vista para jusante do canal rápido (13/08/2025).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 29/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0



Figura 8.17 – Detalhe do canal rápido, na região do maciço da Barragem B5 (20/08/2025).



Figura 8.18 – Vista para jusante do canal rápido (20/08/2025).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 30/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

8.3 MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Após o término do plantio de grama nos taludes à jusante da Barragem B5 executado na Fase 02, a Mosaic informou que periodicamente é realizada manutenção nos acessos e nos taludes, como correção de erosões nos acessos e roçada na grama dos taludes de jusante e ombreiras da Barragem B5. Esse serviço está representado entre a Figura 8.19 e a Figura 8.22.



Figura 8.19 – Detalhe dos taludes de jusante da Barragem B5, com vista para ombreira esquerda (13/08/2025).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 31/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0



Figura 8.20 – Detalhe da grama e da drenagem superficial implementados na região da ombreira direita Barragem B5 (13/08/2025).



Figura 8.21 – Vista para jusante da Barragem B5 (13/08/2025).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 32/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0



Figura 8.22 – Vista para jusante da Barragem B5, com detalhe da região do MV-01 (20/08/2025).

8.4 PERCENTUAL DE AVANÇO

De acordo com o cronograma atualizado disponibilizado pela Mosaic e apresentado no **Anexo A** deste documento, as atividades da Fase 01 e da Fase 02 encontram-se concluídas, com percentual de avanço de 100%. A Fase 03 está em processo final de revisão dos projetos e não sofrerá atraso em relação ao cronograma geral da Descaracterização da Barragem B5, conforme informado pela Mosaic.

As obras do Canal do Reservatório que haviam sido iniciadas na Fase 02 foram suspensas, mas serão retomadas na Fase 03, conforme explicado no item 8.2.2.

A Tabela 8.1 apresenta o percentual de avanço de cada etapa da obra de descaracterização, sendo que, até o momento, foi executado 100% das atividades previstas para a Fase 01 e para a Fase 02. A Fase 03, por sua vez, ainda não teve nenhuma atividade iniciada, conforme o cronograma.

Tabela 8.1– Percentual de avanço – Status da Obra.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
Fase 1 - Obras a Jusante (Readequação para Linha de Centro)	100%
Kick Off Meeting	100%

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 33/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
Montagem Canteiro de Obras	100%
Projeto Sistema de Bombeamento	100%
Aquisição e Instalação do Sistema de Bombeamento	100%
Mobilização para 2ª Etapa Obra	100%
Supressão, Destoca e Limpeza Superficial	100%
Canal de Desvio para Drenar a Praça para Implantação do Reforço	100%
Implantação do Canal em Pedra Argamassada (Desvio Canal Extravador)	100%
Demolição do Trecho do Sistema Extravador na Região do Reforço e do Medidor de Vazão	100%
Tratamento de Fundação (Reforço)	100%
Lançamento e Espalhamento das Transições (brita 1 e 4) sobre o Dreno de Pé	100%
Prolongamento do Dreno de Pé	100%
Execução do Medidor de Vazão na Saída do Dreno de Pé	100%
Lançamento e Compactação da Berma de Reforço em Rejeito de Magnetita até a El. 910,0m	100%
Lançamento de Top Soil sobre a Berma do Reforço em Rejeito de Magnetita	100%
Escavação e Regularização da Praia até a El. 964,5m	100%
Readequação do Eixo do Maciço da Barragem para Jusante	100%
Execução dos Instrumentos (reforço de magnetita)	100%
Execução do Revestimento Vegetal no Maciço Principal	100%
Desmobilização e Data Book	100%
Fase 2 - Novo Sistema Extravador/ Canal Reservatório B5	100%
Kick Off Meeting	100%
Mobilização	100%
Implantação:	100%

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 34/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CONCLUÍDO
- Canal Rápido	100%
- Canal Periférico	100%
- Canal do Reservatório (Cancelado) Será executado na Fase 03	0%
Desmobilização	0%
Fase 2 - Emergencial - Readequação dos Taludes	100%
Kick Off Meeting	100%
Mobilização	100%
Implantação	100%
Desmobilização	100%
Fase 3 - Drenagem e Regularização do Reservatório	0%
Kick Off Meeting	0%
Mobilização	0%
Implantação:	0%
Construção Canal do Reservatório	0%
Construção Travessia definitiva	0%
Projeto Sistema de Ciclonagem de Rejeito	0%
Montagem Sistema de Ciclonagem de Rejeito	0%
Lançamento de Rejeito Underflow para Regularização do Reservatório	0%
Tamponamento do Canal Extravasador Existente	0%
Espalhamento e regularização da superfície do reservatório com caimento para o canal do reservatório	0%
Execução da Camada de Selo Argiloso no Reservatório	0%
Revestimento Vegetal ao longo de todo o Reservatório	0%
Desmobilização do Sistema de Bombeamento implantado durante a obra	0%

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 35/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			CONCLUÍDO
Desmobilização e Data Book			0%

8.5 RECOMENDAÇÕES EMPRESA AUDITORA INDEPENDENTE (SRK)

8.5.1 Recomendações Relatório Trimestral

A obra de descaracterização da Barragem B5 é acompanhada por uma empresa auditora independente (SRK Consulting). No período compreendido neste relatório, a SRK citou algumas recomendações em seu relatório trimestral, documento nº SRK_PR_015_22_RT_212_Rev.0, referente ao período de fevereiro 2025 a abril 2025. Segue abaixo as recomendações mencionadas pela SRK, bem como as tratativas adotadas pela Mosaic:

- *Elaborar os desenhos de “como construído” o mais breve possível das obras concluídas da Fase 02.*
 - Os desenhos “como construído” estão apresentados no *as-built* da obra protocolado nos órgãos competentes, conforme protocolo **FEAM nº - 116287841 e ANM nº 27203.035101/1946-83**. Esses protocolos constam no Anexo 1 deste relatório.
- *Manter o monitoramento constante da instrumentação e as inspeções visuais periódicas.*
 - A Mosaic informou que o monitoramento e as inspeções visuais são realizados periodicamente conforme previsto na legislação. Ela informa ainda que o monitoramento é realizado remotamente por meio de instrumentação automatizada e por leituras manuais. Diariamente, é enviado um relatório via e-mail para a SRK.
- *Realizar poda no talude de jusante, Fotos 10, 11 e 12.*
 - A Mosaic informou que esse serviço é realizado rotineiramente, pois se trata de um processo contínuo da unidade. Esse serviço foi concluído e está representado pela Figura 8.23 e a Figura 8.24.
- *Fazer a manutenção das vias de acesso à bacia de dissipação e ao pé da barragem na ombreira esquerda, para conter erosões e possíveis danos às estruturas. (Fotos 25, 26 e 27).*
 - A Mosaic informou que esse serviço é realizado rotineiramente, pois se trata de um processo contínuo da unidade. Esse serviço está em fase de execução, com previsão de término para outubro 2025 e está representado entre a Figura 8.25 e a Figura 8.31.

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 36/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

Ela informou também que foi concluído um projeto de melhoria para esses acessos, contratado junto à projetista DF+, e será implantado na Fase 03.

- *Atualizar e manter atualizados os gráficos de monitoramentos, piezômetros e medidores de nível d'água, no Sistema Monitora.*

- O Mosaic informou que realiza o monitoramento sistemático e abrangente do comportamento das barragens, com foco na garantia da segurança estrutural ao longo de toda a vida da estrutura geotécnica. Esse monitoramento é realizado por meio das aplicações do sistema de inspeções, aplicações do sistema GPX (automação), da Planilha Monitora e do Logisoil, com base nas atividades previamente definidas. Através da observação e avaliação de parâmetros qualitativos e quantitativos, é possível comparar o comportamento real da estrutura com aquele previsto em projeto. Além disso, o processo deve possibilitar o planejamento e a execução de ações corretivas sempre que forem identificadas anomalias ou desvios significativos.

- *Realizar a limpeza da vegetação no canal periférico, Fotos 15 e 16.*

- A Mosaic informou que esse serviço é realizado rotineiramente, pois se trata de um processo contínuo da unidade. Esse serviço está em fase de execução, com previsão de término para **outubro 2025**. Cabe mencionar, no entanto, que o local mencionado nas recomendações da SRK se trata de uma região imediatamente à jusante do encontro do canal existente proveniente da bacia de contribuição das barragens localizadas à montante (B2 e B1B4) com o canal periférico construído na Fase 2. Salienta-se que as estruturas de montante ainda não foram descaracterizadas e o canal existente não possui revestimento, o que torna a região referente às primeiras estacas do canal periférico implantado sujeita à acumulação de sedimentos oriundos destas estruturas, que tendem a se acomodar no fundo do canal periférico. Dadas estas condições, a DF+ estimula o procedimento de manutenção rotineira hoje praticado pela Mosaic, de maneira que a eventual vegetação e/ou acúmulo de sedimentos não venham a comprometer o funcionamento correto previsto para o canal. A condição atual do canal periférico está representada entre a Figura 8.32 e a Figura 8.36.

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO	Nº MOSAIC -	PÁGINA 37/50	
	Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0	



Figura 8.23 – Vista para ombreira esquerda da Barragem B5, com detalhe da roçada nos taludes de jusante (20/08/2025).



Figura 8.24 – Vista para ombreira direita da Barragem B5, com detalhe da roçada nos taludes de jusante (20/08/2025).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 38/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0



Figura 8.25 – Roçada realizada nos taludes do dique da ombreira esquerda (20/08/2025).



Figura 8.26 – Detalhe da roçada realizada nos taludes e da limpeza dos dispositivos de drenagem superficial (20/08/2025).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 39/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0



Figura 8.27 – Vista para jusante dos taludes da ombreira esquerda (20/08/2025).



Figura 8.28 – Vista para jusante da Barragem B5, com detalhe da roçada realizada nos taludes e limpeza dos dispositivos de drenagem (20/08/2025).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 40/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0



Figura 8.29 – Vista para jusante da Barragem B5, com detalhe da manutenção do acesso ao pé da Barragem.



Figura 8.30 – Roçada dos taludes de jusante da Barragem B5, com detalhe do acesso à berma da elevação 950 m (20/08/2025).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 41/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0



Figura 8.31 – Vista para jusante da Barragem B5 (20/08/2025).



Figura 8.32 – Região de transição do canal existente para o canal periférico da Barragem B5 (estaca 22 a 25), com vista para montante (13/08/2025).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO	Nº MOSAIC -	PÁGINA 42/50	
	Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0	



Figura 8.33 – Limpeza realizada a montante do canal periférico, com vista para montante (13/08/2025).



Figura 8.34 – Limpeza realizada a montante do canal periférico, com vista para jusante (13/08/2025).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 43/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0



Figura 8.35 – Região do canal periférico entre as estacas 25 e 43, com vista para montante (13/08/2025).



Figura 8.36 – Vista para jusante do canal periférico, entre as estacas 50 e 100 (13/08/2025).

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 44/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

8.5.2 Recomendações Avaliação de Documentos Disponibilizados

Conforme solicitado pela FEAM, a SRK Consulting realizou uma avaliação nos últimos relatórios trimestrais enviados pela DF+ e apontou as seguintes observações:

Pontos observados no relatório nº SRK_PR_015_22_RT_123_Rev. 0, referente ao relatório trimestral da DF+ nº DF22-C074-1-ENG-RTE-010.

- No item 2 – Objetivo, página 04/58 o relatório registra o período de julho a agosto de 2024, entretanto o relatório se refere ao período de setembro a novembro de 2024;

- O item 8.2, página 19 a 26/58 registra os serviços anteriores realizados no Canal Periférico, Canal do Reservatório, e Canal Rápido. Entretanto, ressalta-se que para o período de análise do relatório não foram desenvolvidas atividades referentes aos itens citados.

Em análise da observação, foi constatado que o período mencionado no **item 2 – Objetivo** no relatório trimestral da DF+ nº DF22-C074-1-ENG-RTE-010 realmente foi equivocado. Houve um erro de digitação, pois o período correto é de dezembro de 2024 a fevereiro de 2025 e não junho de 2024 a agosto de 2024, porém, consta na página 04/40 e não 04/58.

Em relação ao item 8.2, página 19 a 26/58, a DF+ concorda com a observação da SRK, pois as obras realmente foram finalizadas durante o período compreendido no relatório DF+ nº DF22-C074-1-ENG-RTE-009. Portanto, as fotos inseridas neste item retratam a situação atual dos elementos implantados na Fase 02. Porém, as páginas citadas pela SRK não correspondem ao número de páginas do referido relatório, pois, essa observação está mencionada entre a página 19/40 a 29/40.

Pontos observados no relatório nº SRK_PR_015_22_RT_124_Rev. 0, referente ao relatório trimestral da DF+ nº DF22-C074-1-ENG-RTE-011.

- No item 2 – Objetivo, página 04/58 o relatório registra o período de julho a agosto de 2024, entretanto o relatório se refere ao período de março a maio de 2024;

- O item 8.2, página 19 a 26/58 registra os serviços anteriores realizados no Canal Periférico, Canal do Reservatório, e Canal Rápido. Entretanto, ressalta-se que para o período de análise do relatório a única atividade desenvolvida trata-se da revisão e emissão da versão definitiva do projeto referente à implantação da Fase 3.

Em análise da observação, foi constatado que o período mencionado no **item 2 – Objetivo** no relatório trimestral da DF+ nº DF22-C074-1-ENG-RTE-011 realmente foi equivocado. Houve um erro de digitação, pois o período correto é de março de 2025 a maio de 2025 e não junho de 2024 a agosto de 2024, porém consta na página 04/40 e não 04/58.

Em relação ao **item 8.2, página 19 a 26/58**, a DF+ concorda com a observação da SRK, pois as obras realmente foram finalizadas durante o período compreendido no relatório DF+ nº DF22-C074-1-ENG-RTE-009. Portanto, as fotos inseridas neste item retratam a situação atual dos elementos implantados na Fase 02 e conforme mencionado no item 8.1 do relatório DF+ nº DF22-C074-1-ENG-RTE-011. Porém, as páginas citadas pela SRK, não correspondem ao

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 45/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

número de páginas do referido relatório, pois, essa observação está mencionada entre a página 19/40 a 29/40.

8.6 CRONOGRAMA

Conforme o cronograma atualizado disponibilizado pela Mosaic, apresentado no **Anexo A** deste documento, as atividades de descaracterização da Barragem B5 foram subdivididas em três fases. De acordo com o referido anexo, as obras de descaracterização da Barragem B5 tiveram início em 22/06/2020, com previsão de término em 31/07/2028.

Segundo o cronograma, de modo geral, as atividades para implantação do Canal Periférico encontram-se com percentual de execução em 100%, o Canal do Reservatório foi suspenso e será construído na Fase 03, e as atividades de execução do Canal Rápido encontram-se com percentual de avanço em 100%.

A segunda fase foi concluída em novembro de 2024 e, por fim, a terceira e última fase possui previsão de término em julho de 2028.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A DF+ Engenharia Geotécnica e Recursos Hídricos, como responsável técnica do projeto de descaracterização da Barragem B5, localizada no Complexo Mineralógico de Araxá, apresentou neste relatório a condição atual da Barragem B5, principalmente as estruturas implementadas na Fase 2, no período entre junho de 2025 e agosto de 2025.

O Relatório Trimestral de Obra apresentou o percentual de avanço no processo de descaracterização e o cumprimento das ações previstas na respectiva etapa do cronograma até a completa descaracterização. Este documento visa o atendimento do **Termo de Compromisso** de 25 de fevereiro de 2022, estabelecido entre a Mosaic Fertilizantes e os órgãos públicos responsáveis pela fiscalização do cumprimento das legislações vigentes: Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF), Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e Agência Nacional de Mineração (ANM).

Conforme cronograma disponibilizado pela Mosaic, apresentado no **Anexo A** deste documento, as atividades de descaracterização foram divididas em três etapas, a Fase 01 encontra-se com 100% de avanço, a Fase 02 com 100% e Fase 03 ainda não foi iniciada.

De modo geral, as atividades para implantação do Canal Rápido encontram-se com percentual de avanço em 100%, do Canal Periférico encontram-se com percentual de 100% e do Canal do Reservatório teve sua construção replanejada para a fase 03, segundo o cronograma disponibilizado pela Mosaic. Desta forma, até o presente momento, as ações previstas para a completa descaracterização da Barragem B5 encontram-se em dia com as atividades previstas dentro do prazo estipulado.

As atividades da segunda fase foram concluídas em novembro de 2024 e, por fim, a terceira e última fase possui previsão de término em julho de 2028.

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 46/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

9.0 EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA RESPONSÁVEL POR ESTE RELATÓRIO	
Razão social: DF+ ENGENHARIA GEOTÉCNICA E RECURSOS HÍDRICOS LTDA CNPJ: 39.899.487/0001-21	http: www.dfmais.eng.br
Av. Professor Mário Werneck, 60 - 5º, 6º e 7º andar – 30455-610 – Belo Horizonte / MG Tel. 0 (**) 31 2519 1001 – dfmais@dfmais.eng.br	

EQUIPE TÉCNICA DA DF+		
ESTA EQUIPE PARTICIPOU DA ELABORAÇÃO DESTE DOCUMENTO E RESPONSABILIZA-SE TÉCNICAMENTE POR SUAS RESPECTIVAS ÁREAS		
TÉCNICO	ÁREA DE ATUAÇÃO	RESPONSABILIDADE NO PROJETO
Isabela Fonseca	Recursos Hídricos	Coordenação
Walmir de Castro Melo	Serviços Especializados	Elaboração do Documento

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 47/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

10.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13028:2017 – Mineração - Elaboração e apresentação de projeto de barragens para disposição de rejeitos, contenção de sedimentos e reservação de água – Requisitos.** Rio de Janeiro, p. 24. 2017.

BRASIL. Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010. **Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens e altera a redação do art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000.** Presidência da República – Casa Civil.

BRASIL. Lei nº 14.066, de 30 de setembro de 2020. **Altera a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), a Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, e o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de Mineração).** Presidência da República – Secretaria Geral.

BRASIL. Portaria ANM Nº 95 de 7 de fevereiro de 2022. **Consolida os atos normativos que dispõem sobre segurança de barragens de mineração.** Agência Nacional de Mineração (ANM).

MINAS GERAIS. Resolução conjunta SEMAD/ FEAM nº 2.784, de 21 de março 2019. **Determina a descaracterização de todas as barragens de contenção de rejeitos e resíduos, alteadas pelo método a montante, provenientes de atividades minerárias, existentes em Minas Gerais e dá outras providências.**

MINAS GERAIS. **TERMO DE REFERÊNCIA PARA DESCARACTERIZAÇÃO DE BARRAGENS ALTEADAS PELO MÉTODO DE MONTANTE.** Este Termo de Referência – TR estabelece os requisitos mínimos de um Projeto para a Descaracterização de Barragens alteadas pelo método de montante no Estado de Minas Gerais a ser apresentado à Fundação Estadual de Meio Ambiente, conforme previsto na Lei 23.291, de 25 de fevereiro de 2019, que institui a Política Estadual de Segurança de Barragem. Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Fundação Estadual do Meio Ambiente.

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 48/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

11.0 ASSINATURAS

Araxá – MG, 21 de agosto de 2025.

Assinado por:

Isabela Fonseca

5835300523AC4B3...

Isabela Lima Fonseca – CREA/MG 133985
DF+ Engenharia Geotécnica e Recursos Hídricos Ltda

DocuSigned by:

ELIAS ALVES LIMA

2B321772AA5C474...

Ciente – Elias Alves Lima
Mosaic Fertilizantes P&K Ltda

		DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5	
PROJETO DETALHADO BARRAGENS DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B5 14º RELATÓRIO TRIMESTRAL DE OBRAS (JUN/25 – AGO/25) RELATÓRIO TÉCNICO		Nº MOSAIC -	PÁGINA 49/50
		Nº DF+ DF22-C074-1-ENG-RTE-012	REV. 0

12.0 ANEXOS

ANEXO 1

 <p>Anexo 1.zip</p>	PROCOLOS – FEAM / ANM
--	------------------------------

ANEXO 2

 <p>CG_Descaracterizaç ão B5.pdf</p>	ANEXO A – CRONOGRAMA ATUALIZADO DA OBRA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B5 Formato: PDF Páginas: 2
---	--



DF+ ENGENHARIA

Av. Professor Mário Werneck, 60, 5º, 6º e 7º andar
Estoril, Belo Horizonte / MG – CEP:30455-610
Fone: (31) 2519-1001
www.dfmais.eng.br
